WaitLess

Affärsplan

Innehållsförteckning

Sammanfattning **3**

Bakgrund **3**

Syfte och effekt **4**

Mål **4**

Omfattning och avgränsningar **5**

Avgränsningar *5*

Nulägesanalys **6**

Åtgärder *7*

Intressentanalys **7**

Kommunikationsplan **8**

Organisation – Bemanning **8**

Tidplan inklusive aktivitetslista och milstolpar **9**

Inkomstmodell **9**

Budget och nyttovärdering **10**

Budget *10*

Nyttovärdering *10*

Riskanalys och riskhanteringsplan **11**

Bilagor **12**

Källförteckning **12**

Sammanfattning

I denna affärsplan beskrivs produkten WaitLess, en tjänst för att generera prognoser för kömängder på nöjesparker, vars etablering kommer att genomföras genom ett projekt.

Långa kötider är ett av de största problemen vid besök på nöjesparker. Vår tjänst hjälper besökare att planera sina besök genom att analysera historiska ködata, väderprognoser och evenemang för att ge rekommendationer om de bästa dagarna att åka. Genom en enkel och användarvänlig webbapplikation kan besökare snabbt se när de har störst chans att undvika långa köer.

Tjänsten bygger på en redan etablerad datainsamling från nöjesparkers publika API:er, och vi har idag nästan två års data från Liseberg och Gröna Lund. Den har en hög skalbarhet och kan på sikt utökas till att omfatta fler parker. Tjänsten kommer att vara gratis och finansieras genom annonser, med möjligheter att utöka affärsmodellen genom partnerskap med nöjesparker och affiliate-länkar till biljettförsäljning.

Tjänsten skapar värde för både besökare och nöjesparker. Besökare får främst en bättre upplevelse genom kortare köer, medan nöjesparkerna gynnas av jämnare besöksflöden. Vår unika tillgång till stora mängder historisk data ger oss ett försprång gentemot potentiella konkurrenter, och vi är först på marknaden med en användarvänlig datadriven lösning för köprognoser i nöjesparker. Projektets budget innehåller utgifter för 251 119 kr, samtidigt som nyttovärderingen värderar de totala nyttorna till 316 051 kr. Den uppskattade nettonyttan uppgår därmed till 64 932 kr fem år efter lansering.

Bakgrund

Den ursprungliga affärsidéen uppstod under ett besök på nöjesparken Liseberg i maj 2023. Där konstaterade jag hur mycket skillnaderna i kötid på nöjesparken kan variera mellan olika dagar, vilket beror på att parkens cirka 2,2 miljoner årliga besökare (Liseberg, 2023) är ojämnt fördelade mellan olika dagar. Eftersom bland andra Liseberg presenterar nuvarande kötider i sin app och på sin hemsida uppstod en idé om att man, genom att samla in denna statistik, borde kunna se trender och mönster i när köer är som längst och kortast.

Vid tillfället arbetade jag med IT-infrastrukturövervakning på Region Kalmar Län. Arbetet innefattade insamling och bearbetning av stora mängder statistik, liknande den typen av datainsamling som idéen byggde på. Tillsammans med en kollega hittade jag API:et som Lisebergs kötider hämtas från, och byggde ett Powershell-skript som en gång i minuten hämtar kötider för alla attraktioner och sparar dessa i en databas. Insamlingen från Liseberg startade den 22 juni 2023, och den 1 september samma år driftsattes samma lösning för Gröna Lund. Sedan dess har datainsamlingen pågått med endast korta avbrott.

Till en början visades datan med hjälp av visualiseringsverktyget Grafana. Det gick som förväntat att se övergripande trender, men datan var bara tillgänglig för oss själva i den egna Grafanainstansen. En annan nackdel med den lösningen var att man själv var tvungen att manuellt analysera statistiken och dra slutsatser, vilket är tidskrävande och kräver en viss mån

av specialistkompetens. Tanken med detta projekt är att genom ett webbgränssnitt göra datan tillgänglig och användbar för en bredare allmänhet och även automatisera analysprocessen.

Syfte och effekt

Syftet med produkten är att skapa ett sätt där nöjesparksbesökare baserat på tidigare data kan hitta dagarna med kortast förmodad kötid. I nuläget finns det ingen lösning som gör det vår produkt gör, och det finns därför ett tomrum att fylla. Förhoppningen är att kunna förändra sättet man besöker nöjesparker genom att ge kunden mer kontroll över sitt besök och låta denne göra ett aktivt val i hur upplevelsen kommer bli.

Mål

En plattform ska finnas tillgänglig för allmänheten senast den 31 december 2025.

Vi ska ha nått 10 000 genererade köprognoser senast den 31 december 2026.

Under 2026 ska webbapplikationen ha haft en tillgänglighet på minst 98%.

Omfattning och avgränsningar

I diagrammet nedan beskrivs vad projektet ska leverera.



Avgränsningar

Nedan finns exempel på vad som inte kommer att omfattas av projektet. Dessa kan dock vara funktioner som kan vara värda att överväga att införa i senare skeden.

- Möjlighet att se kötider i realtid kommer inte att inkluderas. Vår tanke är att systemet främst ska användas till planering inför besök, och inte under besök. Det syftet fyller parkernas egna appar bättre. Skulle man införa en sådan funktion i framtiden hade det dock varit möjligt att bygga in funktioner som parkernas appar saknar, exempelvis möjligheten att filtrera bland attraktioner eller att sortera efter kötid.

- Systemet kommer endast bestå av en webbsida, och kommer inte innefatta en mobilapp eller liknande. Den ska dock vara anpassad för mobila enheter, vilket skapar en appliknande upplevelse. Eftersom kommunikation med backend sker via ett API finns även en bra grund för att senare bygga en app.
- Möjlighet att registrera sig och logga in som användare kommer inte att finnas, då det i nuläget inte finns planer på några funktioner som kräver den möjligheten.
- Vid lansering stöds bara de två nöjesparkerna Liseberg och Gröna Lund. Systemet ska dock vara designat med skalbarhet i åtanke, och det ska vara enkelt att lägga till fler parker i framtiden.
- AI eller maskininlärning kommer inte att användas för att skapa prognoser i ett första skede.

Nulägesanalys

Styrkor	**Svagheter**
S1. Vi har nästan två års insamlad data med hög detaljnivå. Om en konkurrent inte redan samlar liknande data hade det tagit lång tid för denne att bygga upp den statistiken.	W1. Begränsade ekonomiska resurser.
S2. Ingen lösning finns idag som gör samma sak. Lyckas man inom rimlig tid driftsätta tjänsten och bygga en användarbas har man ett försprång mot eventuella senare konkurrenter.	W2. Begränsad erfarenhet inom teamet av företagsbyggnad och entreprenörskap.
S3. Erfarenhet inom redundans och drift med höga tillgänglighetskrav finns inom projektteamet.	W3. Ingen förmåga för verktyget att ta fram exakta prognoser. Alla rekommendationer är i grund och botten kvalificerade gissningar baserad på tidigare och förväntad data.
S4. Att verktyget kan användas utan att skapa konto gör att tröskeln är låg för att gå in och prova att söka efter en tid.	
S5. Allt eftersom mängden insamlad data växer ökar förmågan att skapa bra prognoser.	
S6. Valet av webbapplikation som format gör tjänsten lätt att uppdatera med ny funktionalitet, exempelvis nya parker. Eftersom arkitekturen är headless är det lätt att utöka med exempelvis en app.	

Möjligheter	**Hot**
O1. Hos allmänheten finns ett stort och växande behov av kontroll över sin fritid och en vilja att inte slösa sin tid (Tutar & Turhan, 2023). Detta gör att många kan tänkas använda sig av ett verktyg som sparar tid.	T1. Det är inte otänkbart att nöjesparkerna själva arkiverar den ködata de producerar. Därför finns det en risk att de bygger konkurrerande lösningar, särskilt om vår lösning blir populär.
O2. Tidigare införanden av digitala hjälpmedel för nöjesparksbesökare, som livekötider och virtuella köer, har till synes varit framgångsrika. Detta visar på att det finns en vilja från konsumenter att använda digitala lösningar för att effektivisera sina besök.	T2. Vissa har inte möjlighet att gå på nöjesparker under dagar med lägre belastning. Om verktyget bara föreslår datum där man inte kan gå så finns en risk att användaren inte ser syftet med verktyget och därför slutar använda det.
O3. Utvecklingen av AI går snabbt framåt, och om man i framtiden implementerar rekommendationer framtagna med hjälp AI kan dessa bli mer träffsäkra och ta hänsyn till fler faktorer.	T3. Användare är inte vana vid att använda sig av liknande tredjepartslösningar, vilket kan skapa misstänksamhet mot att gå in på en tredjepartshemsida.
	T4. Risk att parkerna stänger ner sina publika API:er för att undvika datainsamling, och istället

	implementerar andra lösningar för att visa kötider på hemsida och app.
	T5. Långt ifrån alla parker tillämpar liveuppdaterade kötider, vilket begränsar vilka parker som tjänsten kan utökas med i framtiden.
	T6. Om nöjesparkerna skulle hävda upphovsrätt på ködatan skulle det bli svårt att driva verksamheten vidare.

Åtgärder

För att kompensera för svagheter och hot kan följande åtgärder vidtas:

- W1: Ekonomisk sparsamhet för att hushålla med budgeten. Exempelvis skulle man kunna börja med en billigare och mindre dimensionerad server för att senare utöka kapaciteten när besöksantalen börjar stiga, och en större server behövs.
- W2: Ta del av utbildningsmaterial i böcker och på internet för att lära sig mer om entreprenörskap och företagsbyggnad.
- W3: Vara tydlig med att det inte finns någon garanti för att prognoserna stämmer, och att verkligheten kan skilja sig från rekommendationerna på grund av många olika faktorer. Poängtera även att prognoserna trots detta förmodligen har bättre träffsäkerhet än om man skulle gissa själv, vilket är det enda alternativet förutom vår tjänst.
- T1: Bygga en god relation med nöjesparkerna i takt med att användarbasen växer. Det skulle kunna vara möjligt att på sikt sälja tjänsten till nöjesparkerna, vilket är ett bättre alternativ än att de bygger en konkurrerande tjänst.
- T2: Vara tydlig med att även om alla de datum man söker bland har långa kötider så kan det göra stor skillnad att ändå välja det datum med bäst prognos.
- T3: Skapa förtroende och inge seriositet genom en snygg och modern design, samt vara transparenta med vilka som ligger bakom tjänsten.
- T4: Undersöka möjligheterna att samla in data på alternativa sätt, exempelvis genom data-scraping. Bygga en god relation med parkerna för att de ska se oss som en potentiell samarbetspartner istället för en konkurrent.
- T5: Driva på nöjesparksbranschens digitala utveckling genom att erbjuda tjänsten, och därmed bidra till att konsumenternas efterfrågan på digitala hjälpmedel i parkerna ökar. På sikt, ta kontakt med parker utan livekötider och försök övertyga dem om varför det är en bra investering.
- T6: Undersöka tidigare rättsfall för att se om det finns prejudikat på området. Bygga en god relation med parkerna för att de ska se oss som en potentiell samarbetspartner istället för en konkurrent.

Intressentanalys

Kärnintressenter	Påverkar	Påverkas
Projektledare	Leder projektet.	Har ansvar för att projektet lyckas.

Webbutvecklare	Utvecklar tjänsten, både backend och frontend.	Behöver avsätta tid för att arbeta med projektet.
UX-designer	Designar systemets frontend och säkerställer användarvänlighet, tillgänglighet och bra utseende.	Behöver avsätta tid för att arbeta med projektet.
Driftansvarig	Driftsätter tjänsten och ansvarar för redundans och övervakning.	Behöver avsätta tid för att arbeta med projektet.
Primärintressenter	**Påverkar**	**Påverkas**
Användare	Använder tjänsten.	Får en positiv eller negativ upplevelse beroende på vilket värde tjänsten skapar för dem.
Sekundärintressenter	**Påverkar**	**Påverkas**
Nöjesparker	Möjliggör insamling av data med hjälp av öppna API:er.	Kan se förändrade kundmönster till följd av tjänsten. Potentiell framtida samarbetspartner.
Leverantör av väderdata	Tillhandahåller väderprognoser som används för att skapa rekommendationer.	

Kommunikationsplan

Vem (Intressent)	**Varför**	**Vad**	**När**	**Hur**	**Ansvarig**
Kärnintressenter	Hålla koll på projektstatus och uppdatera varandra om det pågående arbetet.	Möte med projektteamet	Dagligen eller veckovis, efter behov	Via möte. På plats, distans eller hybrid	Projektledare
Användare	Marknadsföra tjänsten.	Annonsering och allmän informationss pridning	När tjänsten är lanserad	Via sociala medier, affischer	Projektledare
Nöjesparker	Ta in nyheter som skulle kunna påverka projektet	Kolla efter nyheter från nöjesparkerna	Varannan vecka	Via hemsida och sociala medier	Projektledare

Organisation – Bemanning

Roll	**Ansvar**	**Befogenheter**	**Bemanning**

Projektledare	Leder och samordnar projektet. Ser till att projektgruppen vet vad de ska göra och att projektet går åt rätt håll.	Har sista ordet i allt som rör projektet. Avgör vad projektgruppen ska prioritera.	Internt
Webbutvecklare	Utvecklar tjänsten, både backend och frontend. Ansvarar för att systemet uppfyller de ställda kraven och att det byggs på ett hållbart och skalbart sätt.	Avgör vilka tekniska lösningar som är att föredra i olika situationer. Har befogenhet att helt välja bort lösningar ifall dessa inte uppfyller kraven på säkerhet och underhållbarhet som utvecklaren ställer.	Internt
UX-designer	Designar systemets frontend rent visuellt. Säkerställer användarvänlighet och tillgänglighet. Säkerställer att frontenden är snygg och inger ett modernt och professionellt intryck.	Avgör vilka designval som är att föredra. Har befogenhet att göra val som gynnar tillgänglighet och användarvänlighet.	Externt
Driftansvarig	Ansvarar för drift och övervakning av tjänsten efter att den har driftsatts. Ansvarar under projektet för att ta fram infrastruktur som är skalbar och ger möjlighet till redundans.	Avgör vilka driftlösningar och tekniker som är bäst för att upprätthålla långvarig och säker drift. Har befogenhet att helt välja bort lösningar ifall dessa inte uppfyller de krav på säkerhet och skalbarhet som den driftansvariga ställer.	Internt

Tidplan inklusive aktivitetslista och milstolpar

För logisk nätplan, se bilaga 1. För aktivitetslista och gantt-schema, se bilaga 2.

Inkomstmodell

Inkomstmodellen för produkten varierar beroende på vilket skede produkten befinner sig i.

I ett första skede, när inte så många användare upptäckt produkten, använder man sig av generella annonser (t.ex. Google-annonser). Dessa får inte vara störande för upplevelsen och integreras på sidan på ett sätt som ser snyggt och naturligt ut. När användartalen börjar stiga kan man även arbeta för att ta fram riktade annonser tillsammans med samarbetspartners. Exempel på detta hade kunnat vara hotell och restauranger i närheten av den valda nöjesparken. Genom att, via annonserna, erbjuda rabatter kan man förhoppningsvis nå en hög andel klick, och via rabattkoder kan man spåra hur många som har gjort ett köp baserat på annonsen. Genom detta upplägg kan man dels ta betalt per visning och klick, men även genom provision på köp som har gjorts via annonsen.

I ett skede när användartalen har börjat bli stora kan man göra förhandlingar med nöjesparkerna om ett affiliate-program. Tanken med det är att när användaren sökt fram ett

datum får den en länk till parkens hemsida där den direkt kan köpa biljetter för det valda datumet, och går köpet via länken så får man provision på biljettpriset. Genom att tydliggöra i anslutning till länken att denna är en affiliate-länk informeras användaren om att man, genom att använda den, stödjer hemsidan utan att själv betala något extra.

I ett skede när tjänsten har många användare och har börjat bli mycket populär bland besökare kan man överväga att sälja tjänsten som en helhetslösning till nöjesparkerna. Tanken är då att backend-driften kvarstår hos oss, men att den integreras och marknadsförs som en del av nöjesparkens hemsida och/eller app.

Budget och nyttovärdering

Budget

Kostnadstyp	**Kostnadspost**	**Antal**	**Pris/enhet (SEK)**	**Pris (SEK)**
Interna kostnader	Projektledare	80	400/h	32 000
	Webbutvecklare	248	500/h	124 000
	Driftansvarig	32	500/h	16 000
	Oförutsedda kostnader			10 000
Externa kostnader	UX-designer	80	850/h	68 000
	Server Azure	888	0,969/h	860
	Domännamn	1	259/år	259
Totala kostnader				251 119


Nyttovärdering

Utförlig beskrivning av nyttor finns i bilaga 3.

Eftersom det är det egna företaget som står för projektets utgifter är det bara våra nyttor som räknas med i nyttovärderingen. Det är svårt att värdera nyttorna eftersom inkomsterna förväntas bli relativt små i ett tidigare stadie, med förhoppningen att de senare kan öka till följd av växande besökarantal och en expanderande inkomstmodell. Värderingen är beräknad enligt följande:

Nytta	Uppsk. värde år 1	Uppsk. värde år 2	Uppsk. värde år 3	Uppsk. värde år 4	Uppsk. värde år 5	Uppsk. värde första 5 åren	Kommentar
Annonsintäkter	24 000	28 800	34 560	41 472	59 719	188 551	Sifforna är beräknade utifrån en användarbas på 10 000 första året, med en årlig ökning på 20%.
Ökade affärsmöjligheter	5 000	7 500	15 000	35 000	65 000	127 500	Mycket svårvärderat. Lär ge mindre värde första åren för att sedan öka exponentiellt.

De totala nyttorna uppgår alltså till 316 051 kr. Som man ser i diagrammet nedan så innebär detta att nyttorna överstiger kostnaderna på 251 119 kr, vilket innebär att projektets nettonytta uppgår till 64 932 kr och att projektet är värt att satsa på. Man bör dock notera att enligt beräkningen så sker detta först fem år efter lansering.

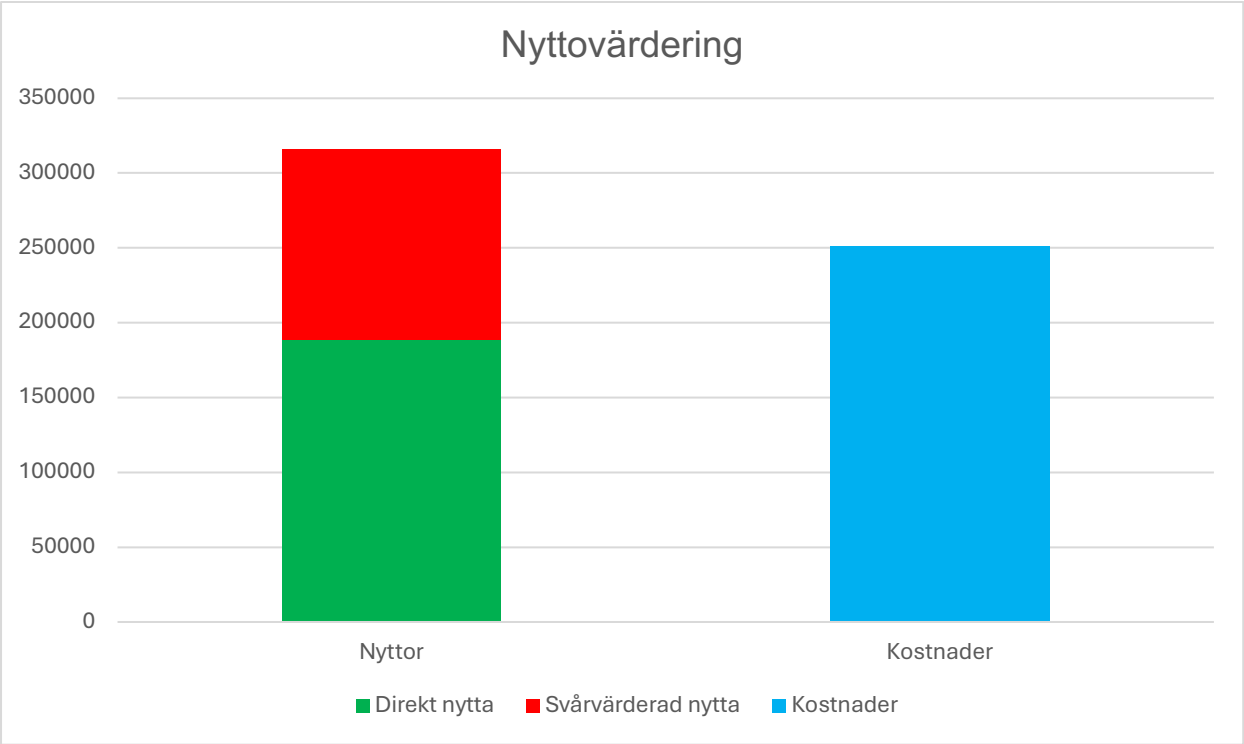

Riskanalys och riskhanteringsplan

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Budgeterade pengar räcker inte.	3	4	12	Hushåll med ekonomiska medel. Se över budget ofta för att tidigt identifiera ökade kostnader.
Parkerna stänger ner sina API:er, och det är inte möjligt att utvinna datan på annat sätt.	2	5	10	Börja så tidigt som möjligt etablera relationer med parkerna för att de ska ha en positiv inställning till verksamheten.
Parkerna hävdar upphovsrätt på ködatan.	1	4	4	–II–
Dålig användartillväxt	4	3	12	Marknadsför väl. Gör ett kontinuerligt arbete för att identifiera svagheter med lösningen och fundera över vad som skulle göra den mer attraktiv för användare.

Bilagor

Bilaga 1: Logisk nätplan.pdf

Bilaga 2: Aktivitetsplan & Ganttschema.xlsx (notera att det finns två blad i dokumentet)

Bilaga 3: Nyttobeskrivning.pdf

Källförteckning

Liseberg. (2023). *Det här är Liseberg.* Hämtad 18 mars, 2025, från https://www.liseberg.se/om-liseberg/var-verksamhet/

Tutar, Ö. F., & Turhan, F. H. (2023). Digital Leisure: Transformation of Leisure Activities. *Shanlax International Journal of Education, 11*(S1), 16–28. https://doi.org/10.34293/education.v11iS1-Oct.6365
